


13/F(L1-047)	
更換前 	更換後 
35/F(L1-133)	
更換前 	更換後 


3.1.2 更換損壞消防鈴手 (DST DI-9204E) 數量: 6 個	
3/F(L1-008)	
更換前 	更換後 
6/F(L1-018)	
更換前 	更換後 

13/F(L1-045)

更換前

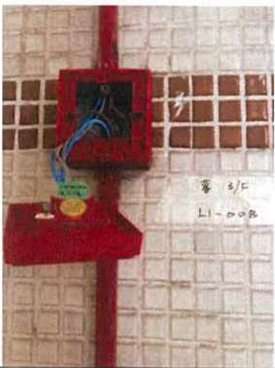

更換後

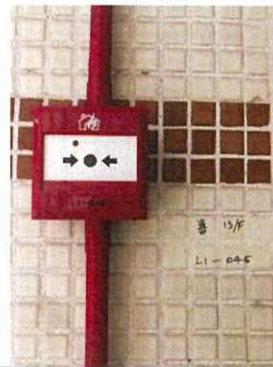

13/F(L1-046)

更換前



更換後




13/F(L1-049)

更換前



更換後

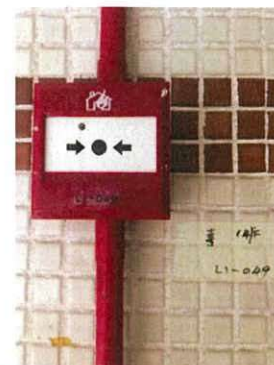


15/F(L1-056)

更換前



更換後

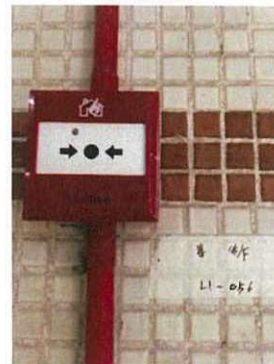

3.1.3. 跟查及維修掣手線路故障 數量: 2 單
22/F(L1-081) 檢查及測試掣手線路正常。
33/F(L1-126) 檢查及測試掣手線路正常。

3.1.4. 跟查及維修消防警鐘線路故障 數量: 4 單
2/F(L1-004) 檢查及測試警鐘線路正常。但發現警鐘損壞, 需報價更換
15/F(L1-055) 檢查及測試警鐘線路正常。
27/F(L1-102) 檢查及測試警鐘線路正常。但發現警鐘損壞, 需報價更換
30/F(L1-114) 檢查及測試警鐘線路正常。但發現警鐘損壞, 需報價更換 工作單位置標示 (L1-144) 是錯的

3.1.5. 更換 5kgCO2 滅火筒 1 支 位置: G/F 總電掣房 証書: 30260190201	
更換前 現場沒有舊滅火筒	更換後 

3.2 愛和樓 :

3.2.1. 跟查及維修掣手線路故障 數量: 1 單
9/F(L1-017) 檢查及測試掣手線路正常。但發現掣手損壞, 需報價更換

3.2.2. 跟查及維修消防警鐘線路故障 數量: 2 單
14/F(L1-032) 檢查及測試警鐘線路正常。但發現警鐘損壞, 需報價更換
22/F(L1-056) 檢查及測試警鐘線路正常。但發現警鐘損壞, 需報價更換

3.3 新和樓 :

3.3.1. 更換損壞消防警鐘 (直徑: 6 吋 24VDC) 數量: 1	
11/F(L1-037)	
更換前 	更換後 

3.3.2 更換損壞消防掣手 (DST DI-9204E) 數量: 5 個	
10/F(L1-35)	
更換前 	更換後 
13/F(L1-045)	
更換前 	更換後 
20/F(L1-075)	
更換前 	更換後 
27/F(L1-101)	
更換前 	更換後 



3.3.3. 跟查及維修消防警鐘線路故障 數量: 2 單

12/F(L1-043) 檢查及測試警鐘線路正常。

26/F(L1-099) 檢查及測試警鐘線路正常。但發現警鐘損壞, 需報價更換

3.4 居和樓

3.4.1. 跟查及維修掣手線路故障 數量: 1 單

6/F(L1-019) 檢查及測試掣手線路正常。但發現掣手損壞, 需報價更換

3.4.2. 跟查及維修消防警鐘線路故障 數量: 2 單

3/F(L1-005) 檢查及測試警鐘線路正常。但發現警鐘損壞, 需報價更換

33/F(L1-126) 檢查及測試警鐘線路正常。但發現警鐘損壞, 需報價更換
工作單位位置標示 22/F 是錯的

3.4.3. 更換 9kg 水劑滅火筒 2 支 位置: G/F 証書: 30260190202



3.5 翠和樓

3.5.1. 更換損壞消防警鐘及線路 (直徑: 6 吋 24VDC) 數量: 6

16/F(L1-059)

更換前



更換後



17/F(L1-064)

更換前



更換後



20/F(L1-076)

更換前



更換後



22/F(L1-084)

更換前




更換後



28/F(L1-105) 工作單位位置標示 30/F 是錯的

更換前

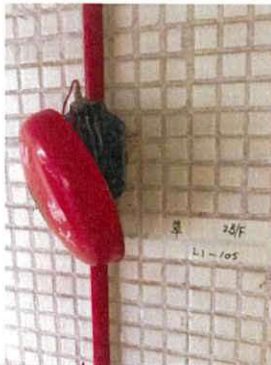

更換後



34/F(L1-129) 工作單位位置標示 35/F 是錯的

更換前



更換後



3.5.2 更換損壞消防掣手 (DST DI-9204E) 數量: 1 個

27/F(L1-101)

更換前



更換後



3.5.3. 更換 9kg 水劑滅火筒 1 支 位置: G/F 証書: 30260190203

更換前



更換後



3.6 麗和樓:

3.6.1. 更換損壞消防警鐘 (直徑: 6 吋 24VDC) 數量: 1	
5/F(L1-013)	
更換前 	更換後 

3.6.2. 跟查及維修掣手線路故障 數量: 1 單 位置:C 翼全部(2/F-35/F)(34 個)
檢查及維修線路後, 測試掣手線路回復正常。

3.6.3. 跟查及維修消防警鐘線路故障 數量: 2 單
C 翼(2/F-16/F)(15 個) 檢查維修線路後, 測試警鐘線路回復正常。
18/F(L1-066,L1-067,L1-068) 檢查維修線路後, 測試警鐘線路回復正常。 工作單位置標示 (L1-069) 是錯的

3.7 安和樓

3.7.1. 跟查及維修消防警鐘線路故障 數量: 2 單
4/F-14/F(近 22 及 27 室)檢查線路正常。由於警鐘電池箱損壞, 未能作測試。
15/F-22/F 全部檢查線路正常。由於警鐘電池箱損壞, 未能作測試。

3.7.2. 更換 9kg 水劑滅火筒 1 支 位置: G/F 証書: 30260190204	
更換前 現場沒有舊滅火筒	更換後 

3.8 福和樓

3.8.1 更換損壞消防警鐘 (直徑: 6 吋 24VDC) 數量: 1

2/F(L1-004)

更換前



更換後




3.8.2. 更換損壞消防掣手 (DST DI-9204E) 數量: 2 個

5/F(L1-013)

更換前




更換後

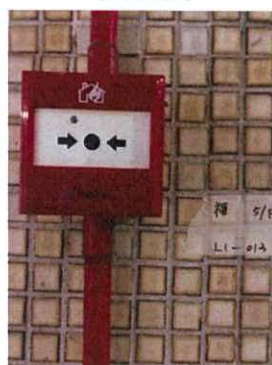


30/F(L1-116)

更換前

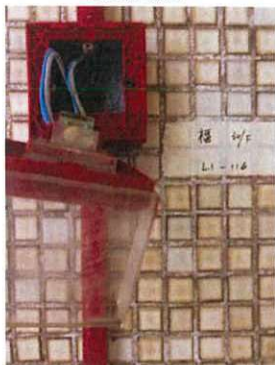

更換後

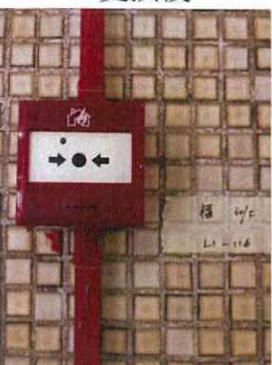

3.9 亨和樓:

3.9.1. 跟查及維修消防警鐘線路故障 數量: 1 單

8/F(L1-019) 檢查及測試警鐘線路正常。但發現警鐘損壞, 需報價更換

3.10 更換損壞之消防系統控制掣箱工程::

翠和樓	
更換前 	更換後 
麗和樓	
更換前 	更換後 
福和樓	
更換前 	更換後 

3.11 更換居和樓消防上水泵工程:

居和樓 G/F	
更換前 	更換後 

綜合所有跟查及維修線路故障後，以下損壞事項需要報價更換:

3.1.4-警鐘 x3

-2/F(L1-004)

-27/F(L1-102)

-30/F(L1-114)

3.2.1-掙手 x1

-9/F(L1-017)

3.2.2-警鐘 x2

-14/F(L1-032)

-22/F(L1-056)

3.3.3-警鐘 x1

-26/F(L1-099)

3.4.1-掙手 x1

-6/F(L1-019)

3.4.2-警鐘 x2

-3/F(L1-005)

-33/F(L1-126)

3.9.1-警鐘 x1

-8/F(L1-019)

總數量: 掙手 x2, 警鐘 x9

另發現以下位置本身已有損壞，建議更換:

喜和樓-掙手 x3

- 7/F(L1-024)，30/F(L1-115)，35/F(L1-135)

愛和樓-掙手 x1

- 17/F(L1-042)

新和樓-掙手 x2

- 12/F(L1-042)，25/F(L1-096)

居和樓-掙手 x2

- 16/F(L1-058)，32/F(L1-121)

翠和樓-掙手 x1

- 4/F(L1-009)

麗和樓-掙手 x4

- 9/F(L1-032)，24/F(L1-091)，26/F(L1-100)，27/F(L1-101)

福和樓-掙手 x4

- 2/F(L1-001)，15/F(L1-056)，34/F(L1-131)，34/F(L1-130)

總數量: 掙手 x17
